

تقنية المباني مسبقة الصنع
PREFABRICATED BUILDINGS TECH.

دراسات

إشراف

تصميم



المخططات

مشروع : البيت ($18.8 \times 9.8 = 184.24 \text{ م}^2$)

المالك : محمد يحيى صالح السديري
(الرياض)



القصيم - الخبراء - طريق الرياض المدينة السريع - جوال / 0532212020

المحتوى

1	المحتوى .	10	تمديدات السباكة .
2	منظور الواجهة الامامية .	11	أعمال الكهرباء وتمديداتها .
3	منظور الواجهة الخلفية .	12	أطوال السقف الخارجي .
4	منظور الواجهة الجانبية (1) .	13	مواصفات الصبة والتمديدات الخارجية .
5	منظور الواجهة الجانبية (2) .		
6	منظور اسقاط المبنى .		
7	إرتفاعات المبنى .		
8	مسقط المبنى .		
9	مقاسات الأبواب والنوافذ وموديلاتهما .		














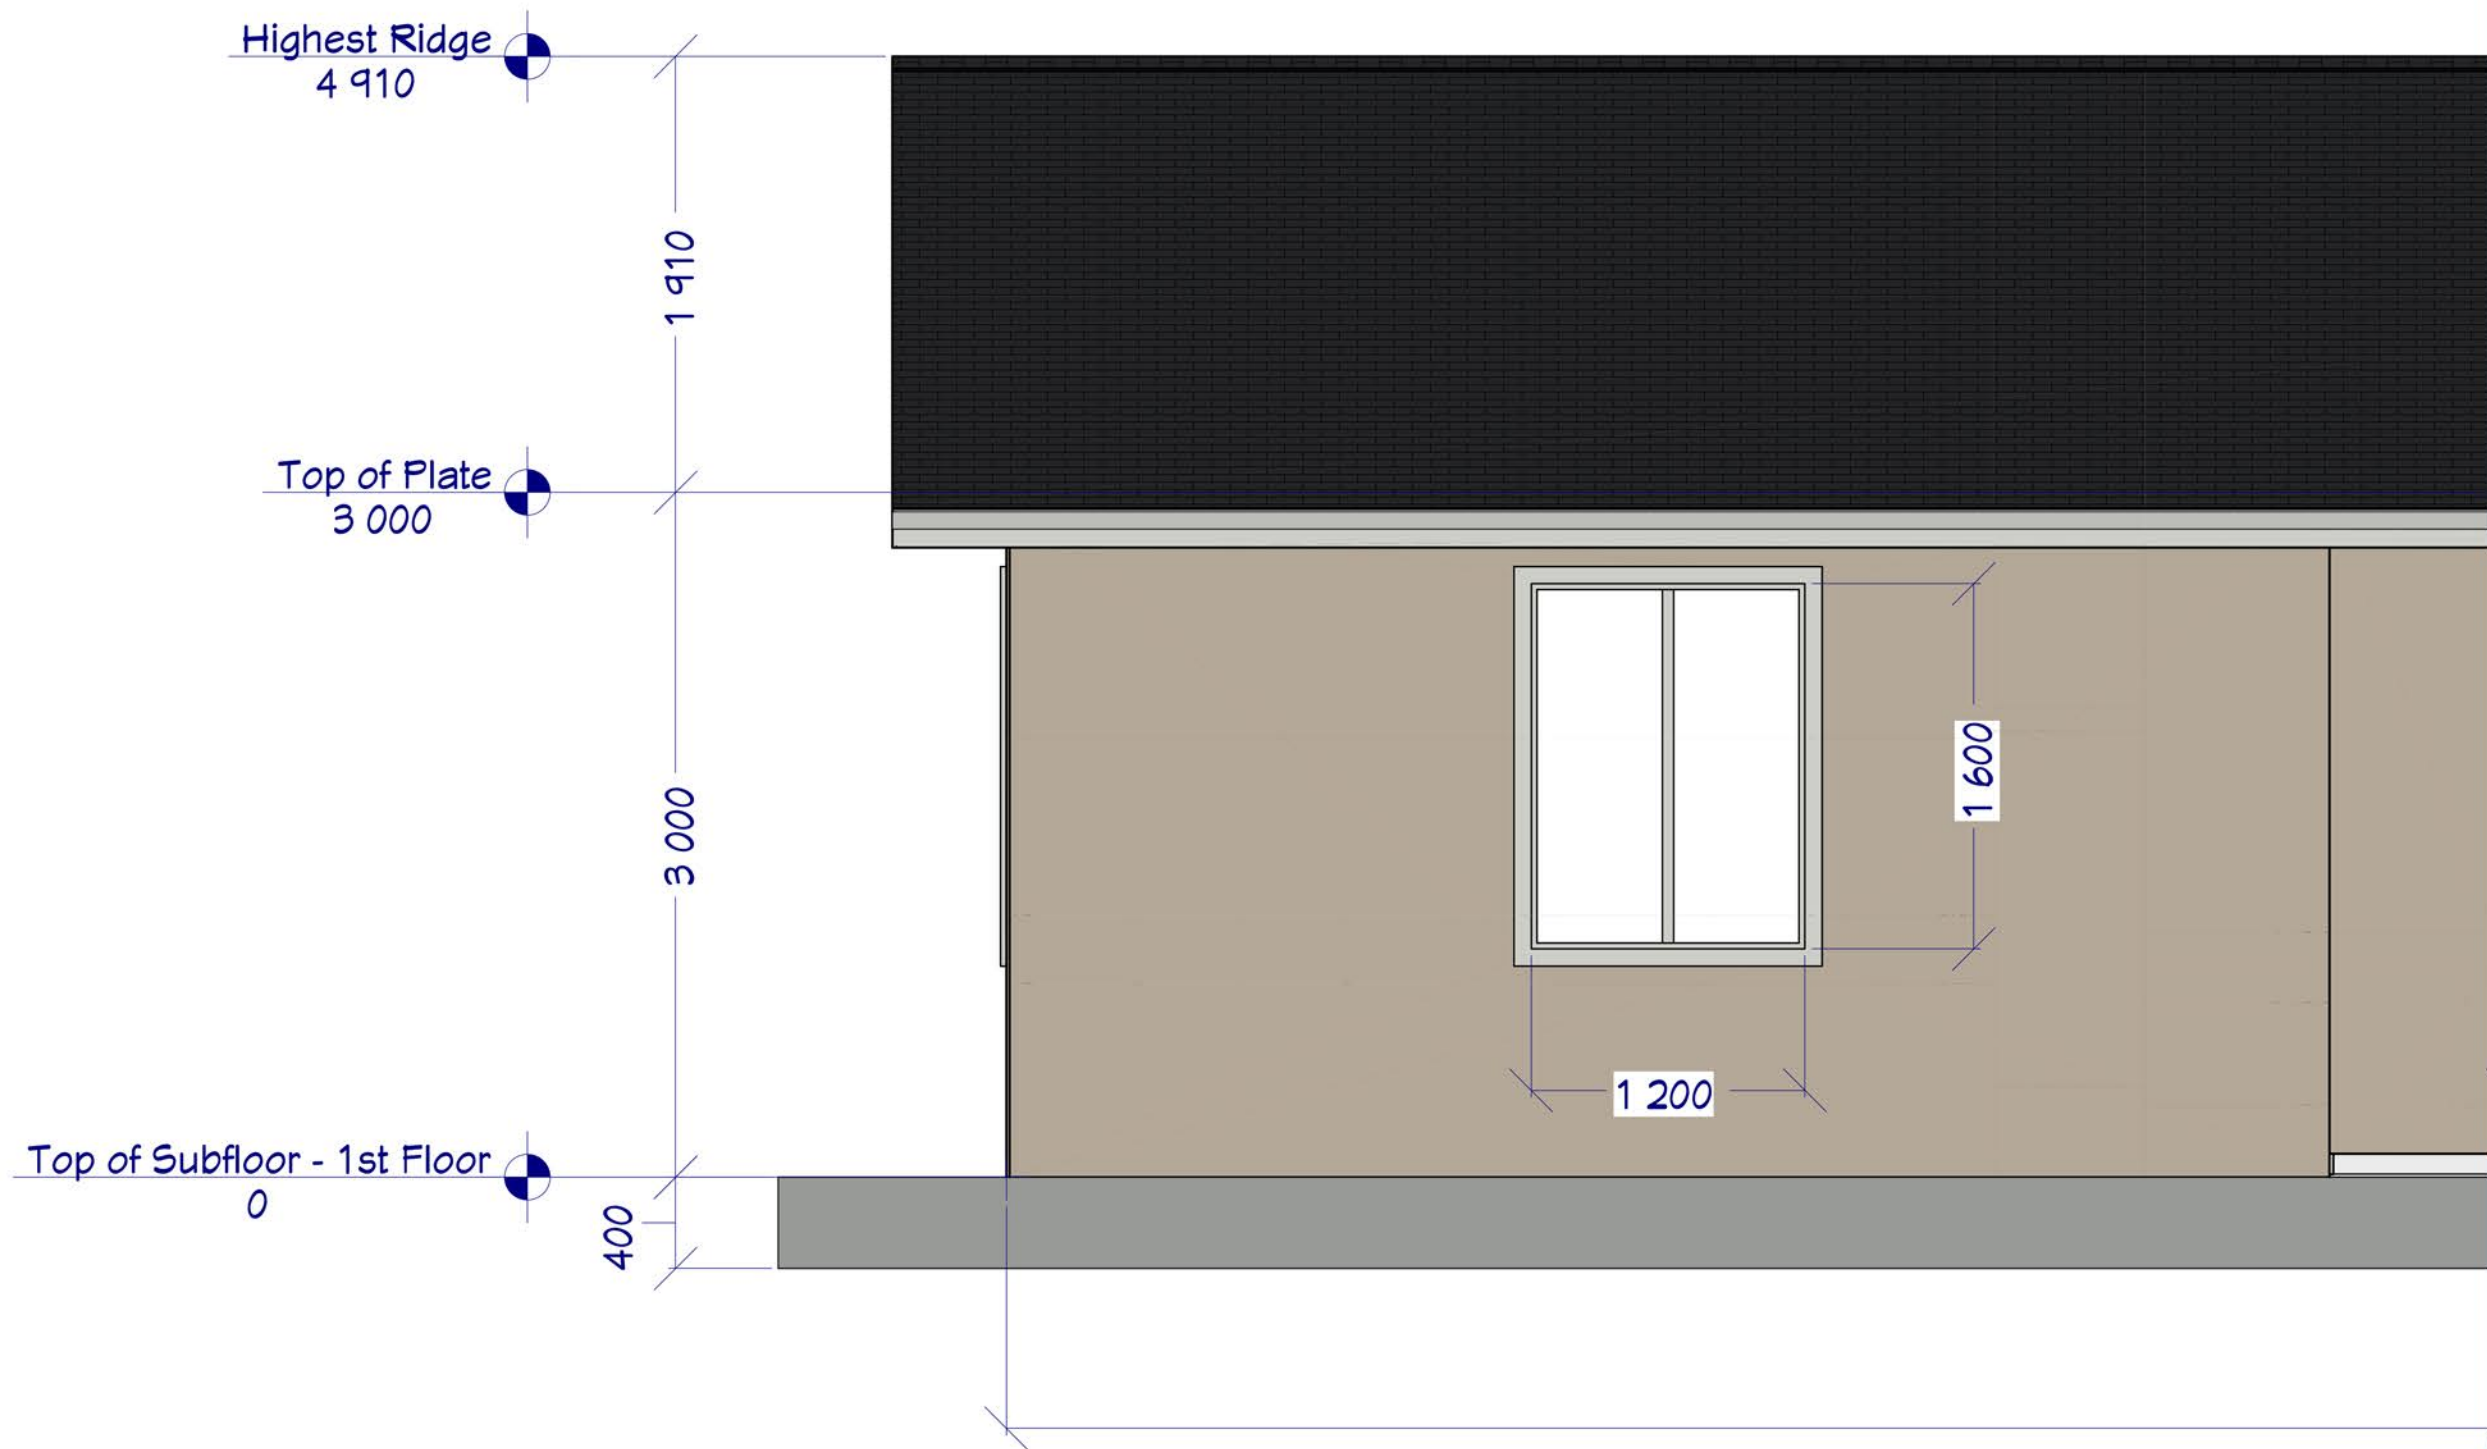

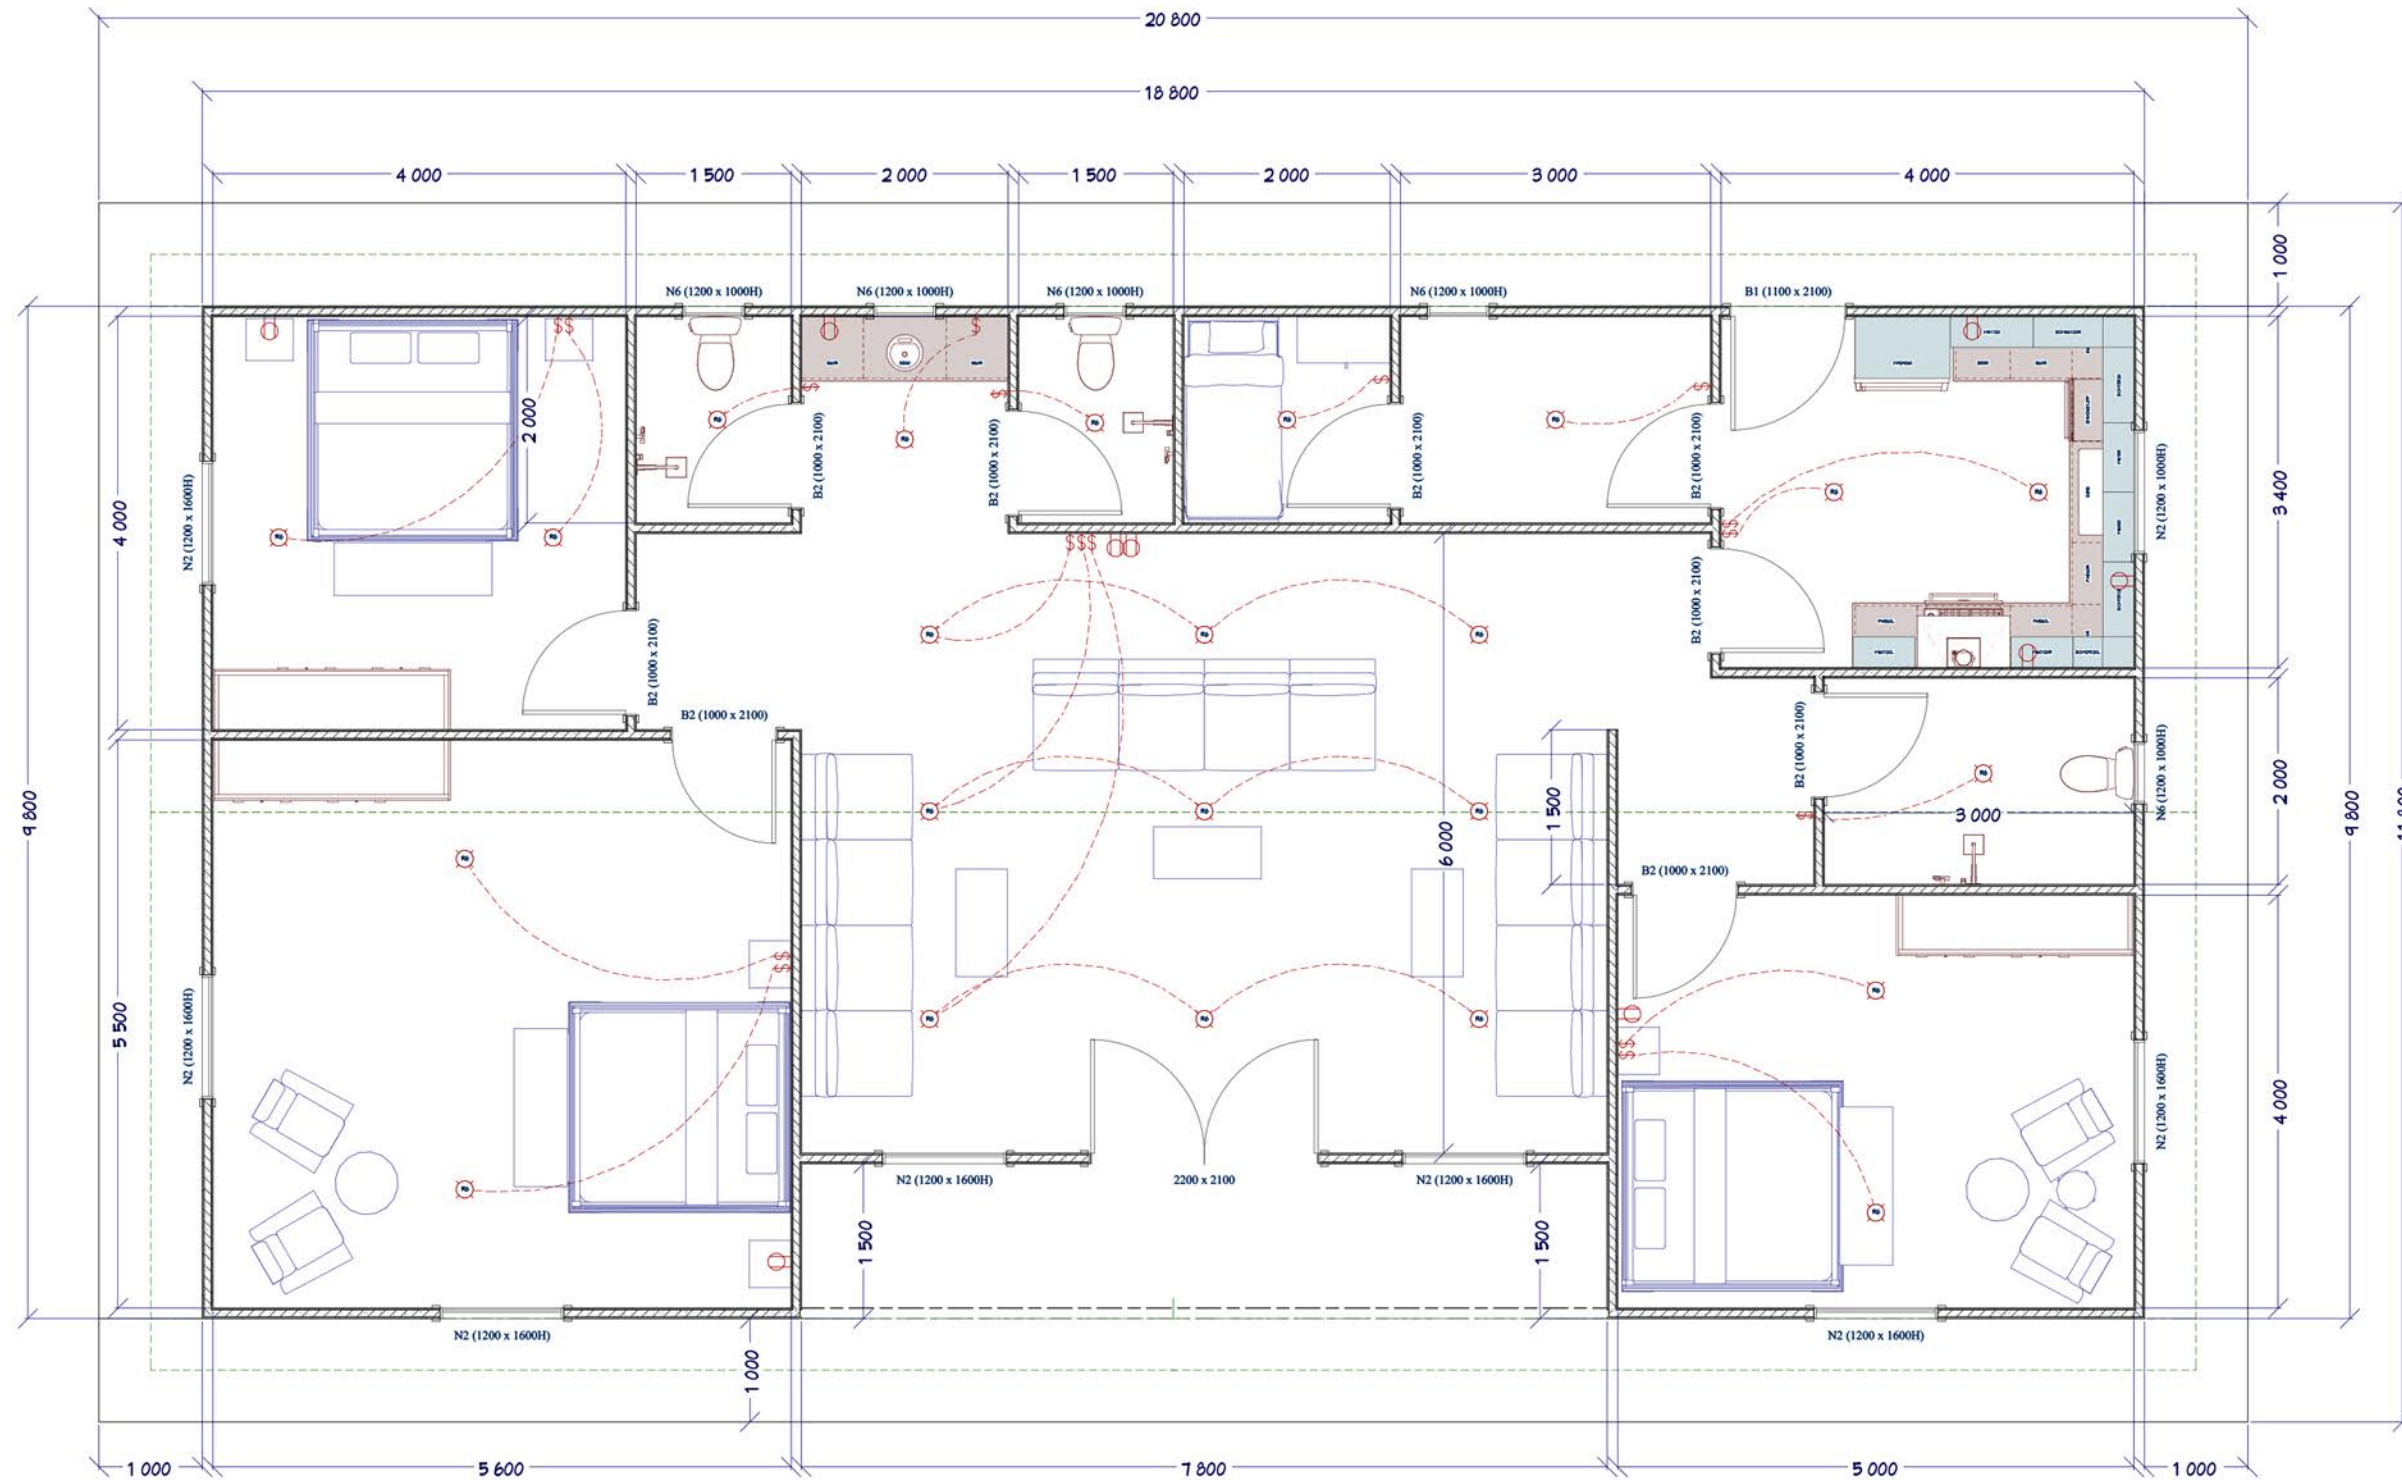

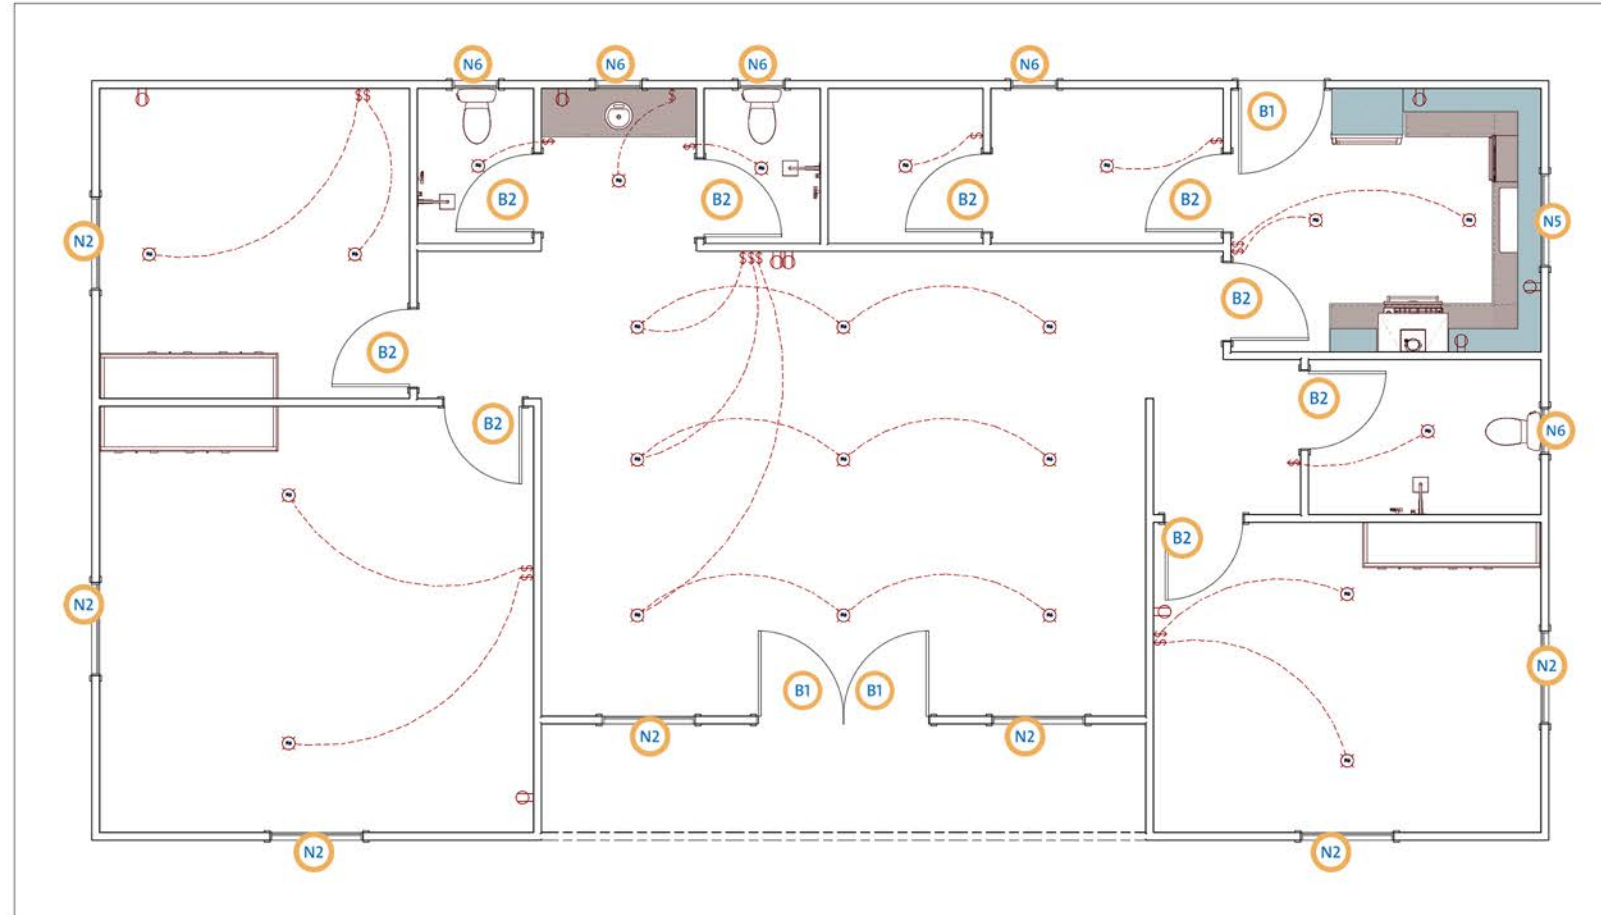


جدول نماذج الأبواب

العدد	البيان	مقاسات		النموذج
		ارتفاع (متر)	عرض (متر)	
3	الباب الخارجي	2.10	1.10	B1
9	الباب الداخلي	2.10	1.00	B2
12	المجموع :			


جدول نماذج النوافذ


العدد	البيان	مقاسات			النموذج
		جلسة (متر)	ارتفاع (متر)	عرض (متر)	
-	شباك	0.75	1.60	1.60	N1
7	شباك	0.75	1.60	1.20	N2
-	شباك	0.75	1.60	1.00	N3
-	شباك	0.75	1.60	0.55	N4
1	شباك	0.75	1.00	1.20	N5
5	شباك	0.75	0.60	0.60	N6
13	المجموع :				

موديل أبواب

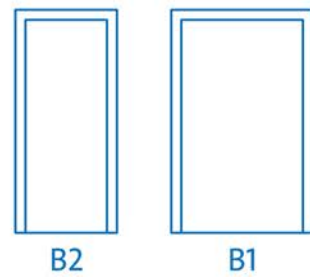

موديل نوافذ



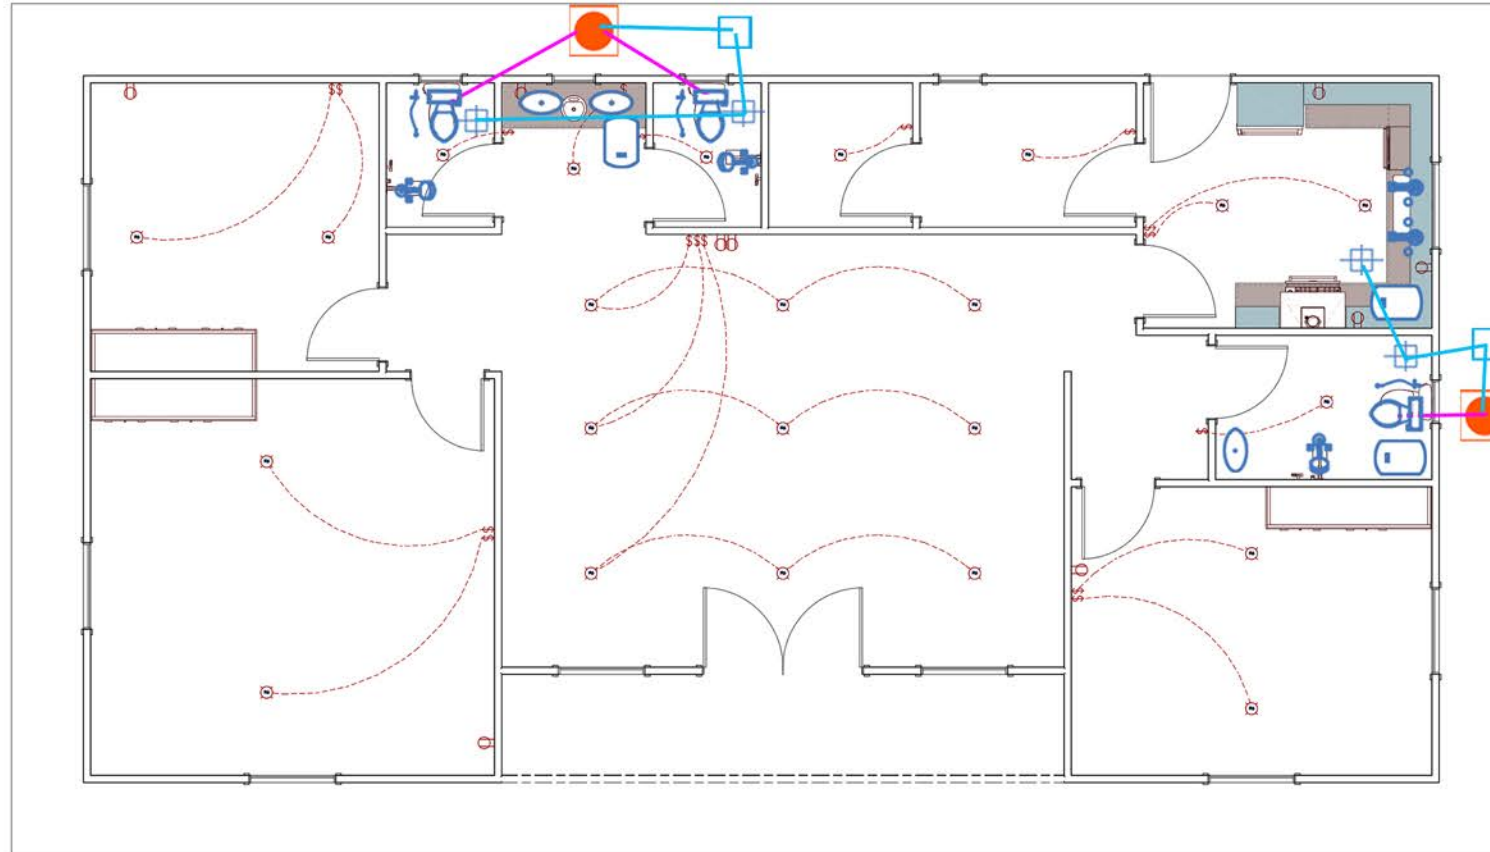


جدول الرموز

الرمز	الصورة	البيان	العدد
		كرسي عربي	-
		كرسي افرنجي	3
---		ماصورة حار بارد 3/4	-
		صفاية	4
		خلاط مطبخ	1
		شطاف كرسي	3
		خلاط دش	3
		خلاط حلو	1
		مغسلة	3
		سخانة	3
		المجموع :	21


ملاحظة هامة


- 1 - صفاية المطبخ تبعد عند الجدار 1 م .
- 2 - يبعد الكرسي الافرنجي عند الجدار 33 سم .
- 3 - يوجد مع كل حمام مغسلة واحدة فقط + 1 صفاية + 1 سخانة + 1 كرسي + خلاط دش .

جدول الكهرباء

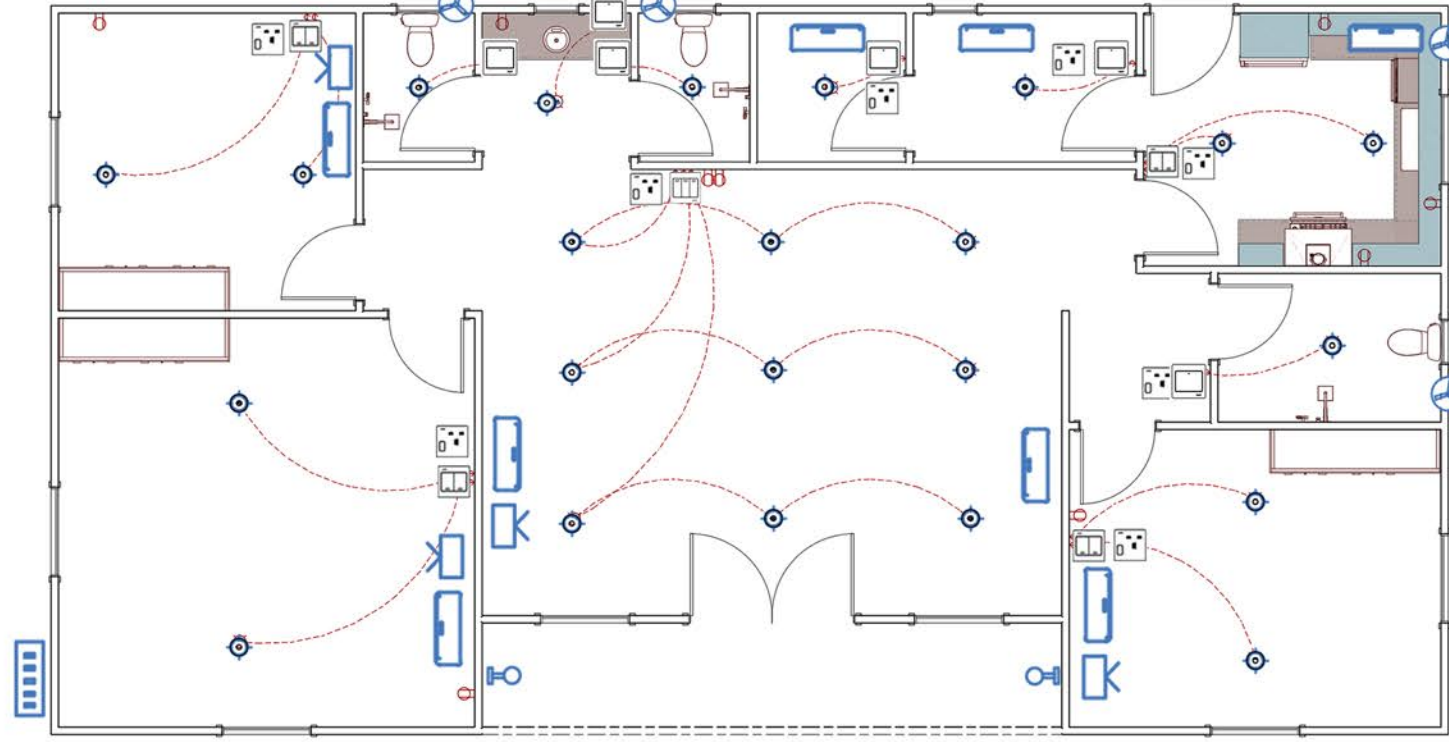


الرمز	الصورة	المصطلحات	العدد
		لمبة السقف	23
		لمبة الجدار	2
		فيش ثلاثي	8
		مفتاح مفرد	6
		مفتاح مجوز	4
		مفتاح ثلاثي	1
		مفتاح رباعي	-
		فيش تلفزيون	4
		مكيف اسبلت مفتاح	8
		مروحة شفت	5
		طبلون	1

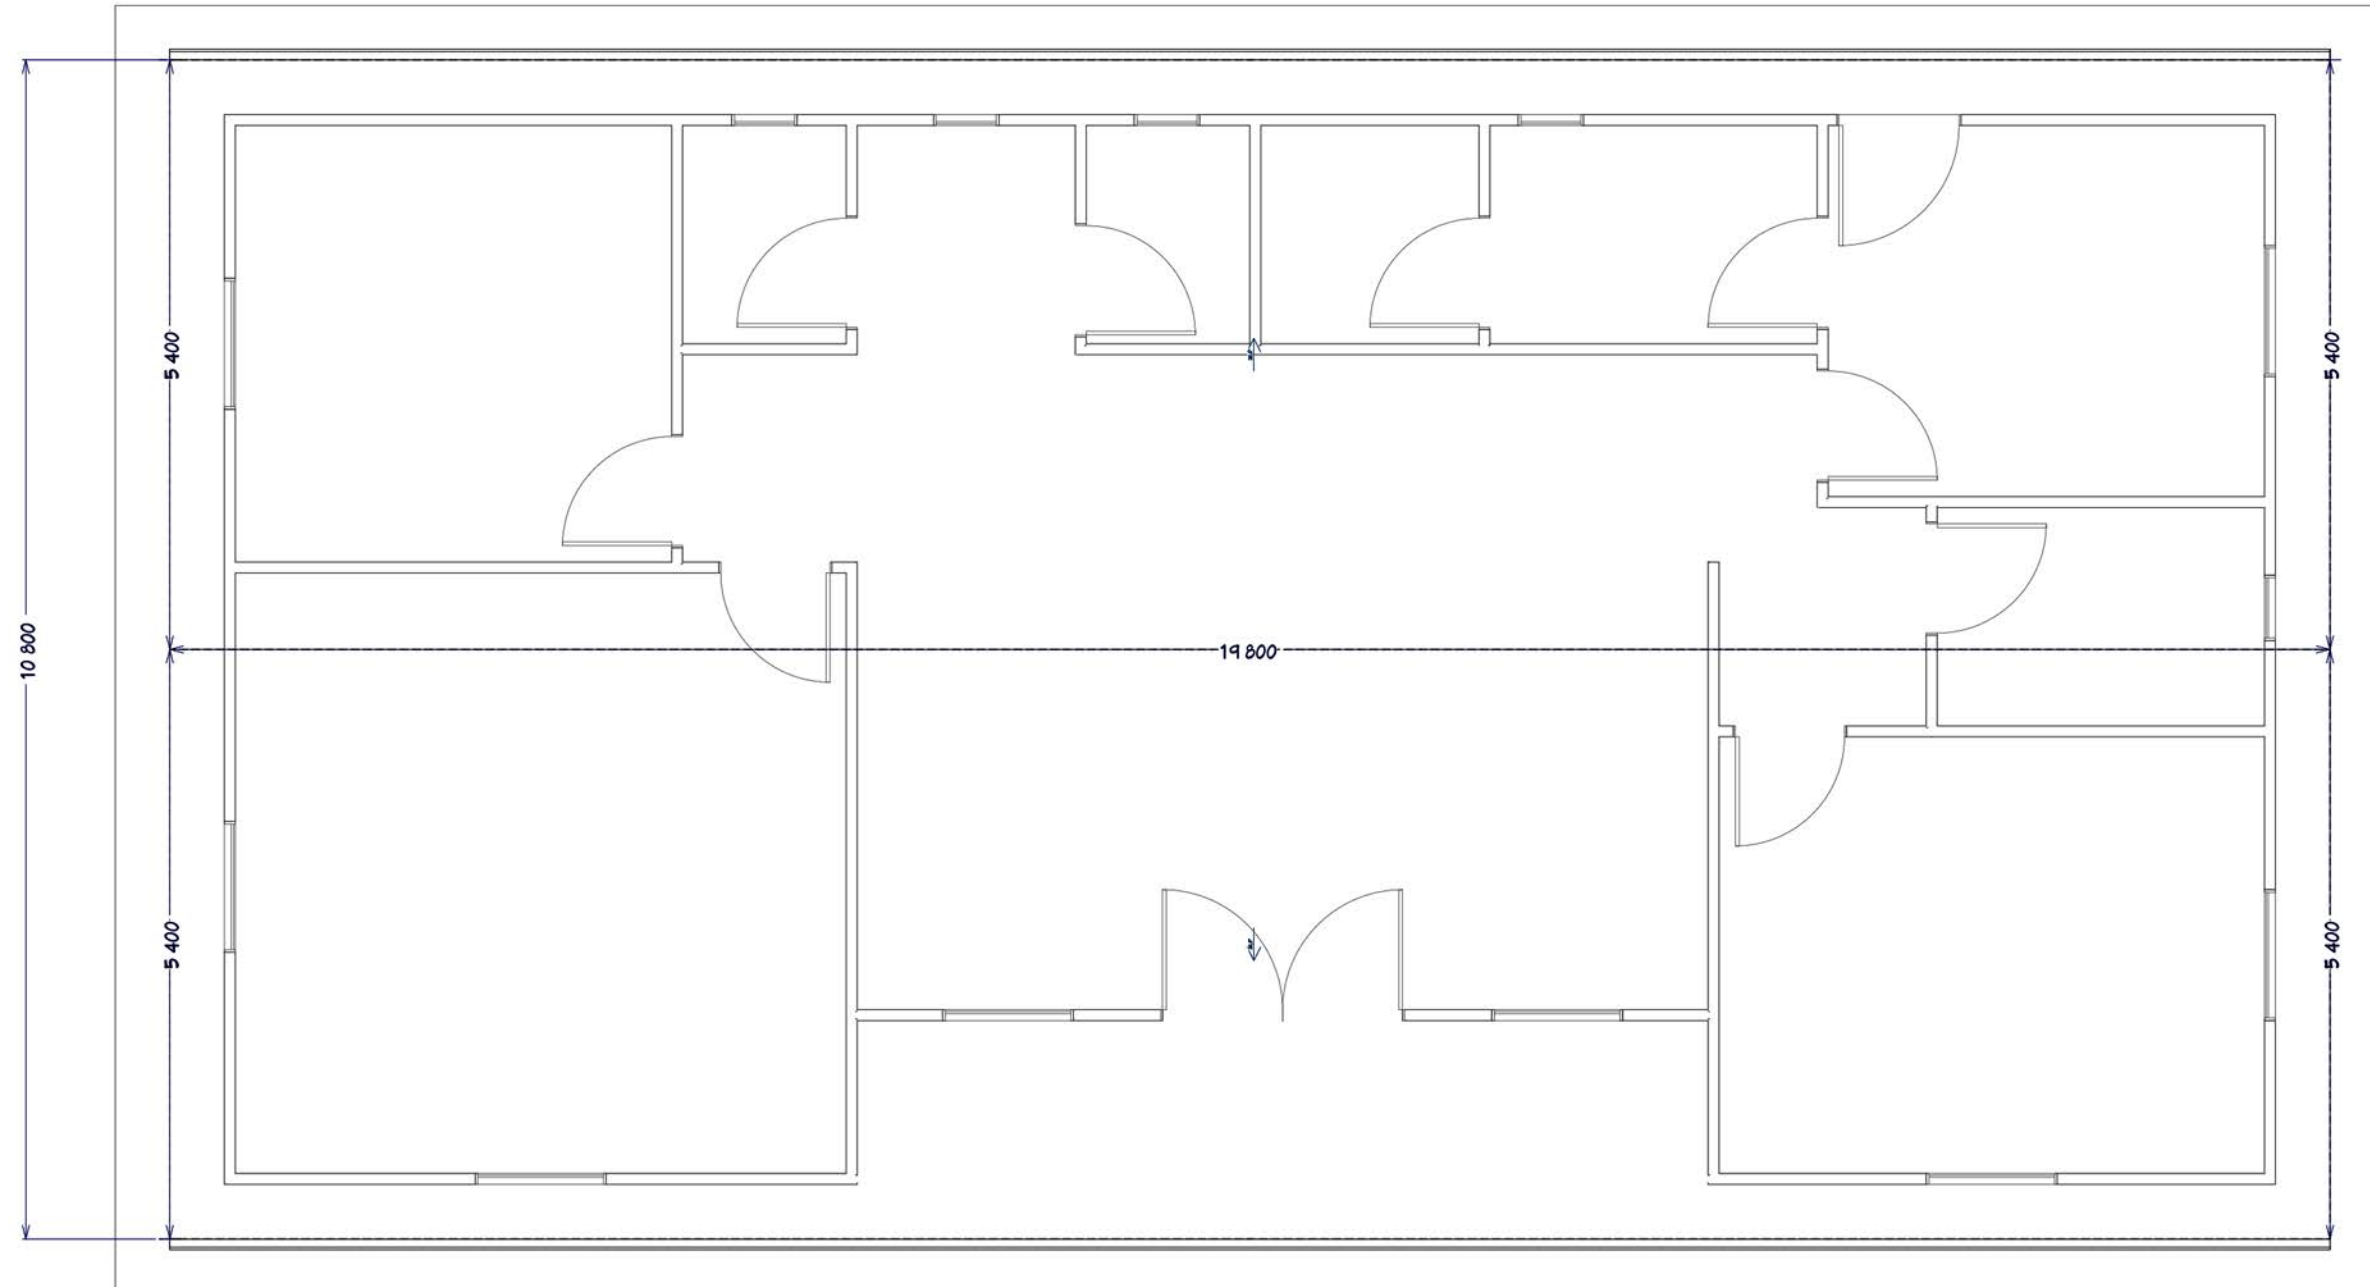

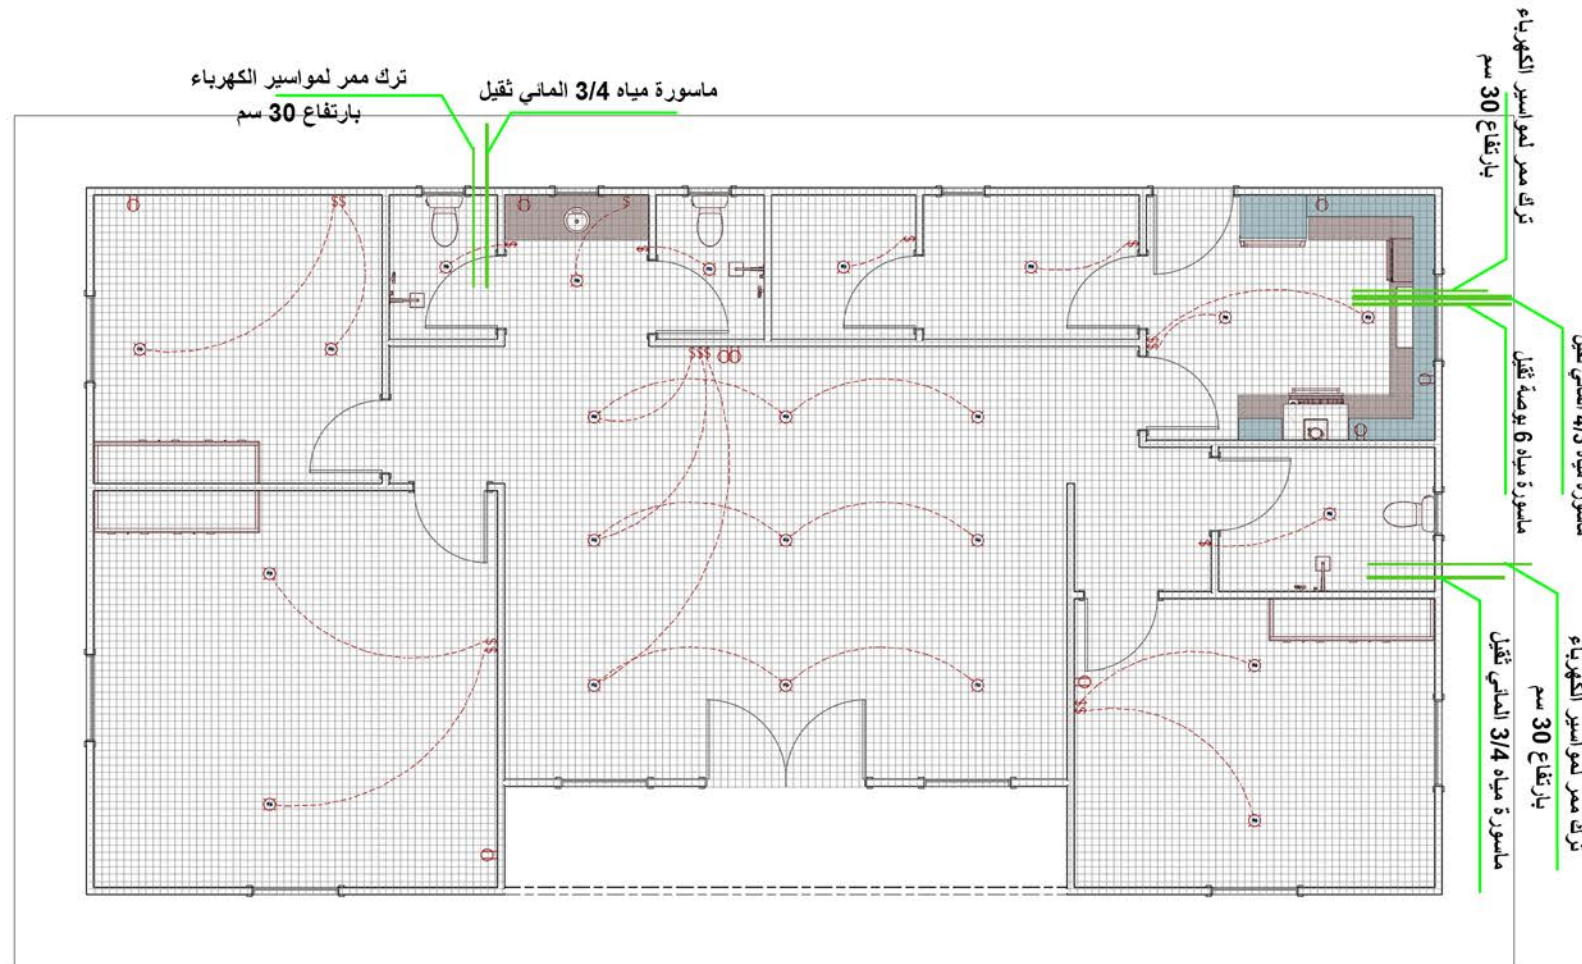

- 1 - يجب عمل ميده ارتفاع 60 سم .
- 2 - يجب ترك ممر للمواسير السبابة بقياس 30 سم .
- 3 - يجب رص التربة برصاصة صغيرة مع سقيا الأرضية أكثر من مرة ماصورة .
- 4 - سماكة الصبة 15 سم للدور الواحد، و 20 سم للدورين .
- 5 - يجب وضع الصبة على مستوى واحد بدون أي ميول .
- 6 - تعمل الميدة أولا ومن ثم يتم ردم المكان ويرش جيد ويرص ومنها تعمل الشبكة 30x30 سم وتصب خرسانة وينعم .
- 7 - تمديد كل من ماصورة الحمام والمطبخ و المجاري الخارجية و ماصورة الماء داخل و ماصورة الكهرباء الرئيسية قبل صب الأرضية مع العلم بأن ماصورة الصرف الصحي لا تقل عن 4 بوصة ثقيل تزرع داخل الصبة من قبل العميل .

مواصفات الشبك



10 x 10 سم صبة مع 4 مم .



بارك الله لك فيه



تقنية المباني مسبقة الصنع
PREFABRICATED BUILDINGS TECH.
